


# Light

## 개발제안서

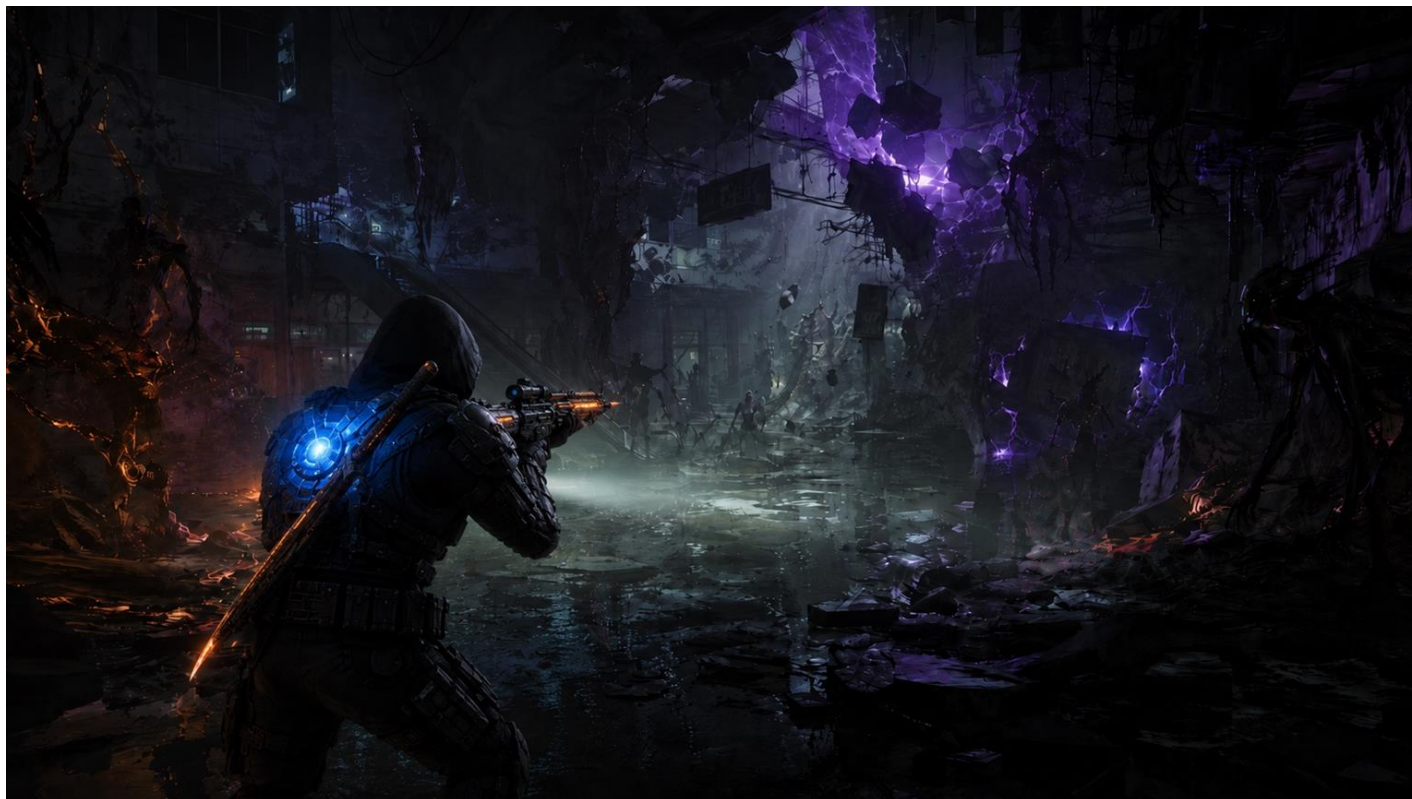

| 항목    | 내용         |
|-------|------------|
| 프로젝트명 | Light      |
| 문서 성격 | 게임 개발제안서   |
| 작성자   | 김재준        |
| 작성일   | 2026-06-25 |

# 목차

- 1. 프로젝트 개요 ..... 3
- 2. 시장 분석 ..... 4
  - 2.1. 동향 ..... 4
  - 2.2. 벤치마크 ..... 4
- 3. 콘텐츠 요약 ..... 5
- 4. SWOT / STP / MDA 분석 ..... 6
  - 4.1. SWOT ..... 6
  - 4.2. STP 도표 ..... 7
  - 4.3. MDA 연결 구조 ..... 8
- 5. 기대 매출 ..... 9
  - 5.1. 기대 매출 시나리오 ..... 9
- 6. MM 기반 조직 및 마일스톤 ..... 10
  - 6.1. MM 산정 원칙 ..... 10
  - 6.2. 24 개월 마일스톤 ..... 11
  - 6.3. Gate 의사결정 기준 ..... 11
- 7. 소요비용 견적 ..... 13

# 1. 프로젝트 개요

본 문서는 「Light」의 핵심 개념, 시장 적합성, 핵심 타겟, 플레이 경험 방향, 콘텐츠 구조를 제안하기 위한 개발제안서이다.

게임의 장르적 방향과 차별화 요소를 정리하고, 빛 생존·공포·익스트랙션 루프가 하나의 플레이 경험으로 연결되는 방식을 설명한다.

| 항목     | 내용                                                      |
|--------|---------------------------------------------------------|
| 게임명    | Light                                                   |
| 장르     | 미드코어 공포 익스트랙션 FPS                                       |
| 플랫폼    | PC / Steam                                              |
| 핵심 개념  | 빛이 곧 생존이다.                                              |
| 핵심 플레이 | 경계 공간에 진입해 빛을 관리하고, 자원을 회수한 뒤 전송 또는 탈출로 보상을 보존하는 FPS 구조 |
| 핵심 차별점 | 빛 자원 관리, 리미널 스페이스 공포, PvPE 손실·탈출 루프를 하나의 판단 구조로 연결      |
| 줄거리 요약 | 벡터그룹이 특수 자원을 회수하려는 과정에서 현실과 공허가 뒤섞인 경계 공간의 실체가 드러난다.    |
| 제안서 목적 | 게임의 시장 적합성, 타겟 유저, 플레이 경험, 콘텐츠 구조를 제안                   |

## 기획 목표

「Light」는 익스트랙션 FPS의 손실 긴장감에 공포 생존의 시야 제한과 빛 자원 관리를 결합해, 짧은 매치 안에서 탐색·위협·생환 판단이 반복되는 미드코어 FPS 경험을 제공하는 것을 목표로 한다.

## 2. 시장 분석

### 2.1. 동향

글로벌 게임 시장은 2025 년 약 **2,016 억 달러** 규모로 성장했으며, PC 시장은 **436 억 달러**, 전년 대비 **12.0% 성장**을 기록했다.

특히 PC 풀게임 매출은 전년 대비 **25% 증가**해, 고품질 패키지·프리미엄 기반 게임의 구매력이 여전히 강한 플랫폼임을 보여준다.

FPS/슈터 장르는 PC·콘솔 플레이타임 기준 주요 상위 장르로 유지되고 있으며, 익스트랙션 슈터는 단일 유행을 넘어 독립적인 하위 장르로 자리를 잡고 있다.

대표적으로 **Escape from Tarkov** 는 2025 년 PC 전체 플레이타임 기준 11 위에 올랐고, **ARC Raiders** 는 PvPvE 익스트랙션 슈터로 출시 후 400 만 장 이상 판매와 70 만 명 이상의 동시 접속을 기록했다.

**공포 장르** 역시 Steam Next Fest 2025 에서 호러·어드벤처 계열 데모가 강한 비중을 보였고, 협동 공포·생존 공포·심리적 압박을 결합한 게임들이 초기 관심 확보에 유리한 흐름을 보였다. 이는 **Light** 의 어둠, 시야 제한, 사운드 탐지, 괴물 조우, 탈출 압박 구조와 직접 연결된다.

### 2.2. 벤치마크

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                 |
| Escape from Tarkov                                                                                                                                             | Arc Raiders                                                                                                                                                                                  | Lethal Company                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 익스트랙션 FPS 장르의 대표 기준작</li><li>• 익스트랙션 장르의 게임 플레이 구조 정립</li><li>• 총기 커스터마이징, 부위 피해, 인벤토리, 경제 시스템 등 하드코어 몰입도 강점</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• PvPvE 익스트랙션 슈터의 대중화 사례</li><li>• 출시 10 주 만에 누적 판매 1,240 만 장 이상, 최고 동시 접속 96 만 명 기록</li><li>• AI 적, PvP 교전, 파밍, 탈출을 결합하면서도 타르코프보다 접근성 높은 구조</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 협동 공포 생존 게임의 대표 성공 사례</li><li>• 2024 년 기준 판매량 1,000 만 장 이상 추정</li><li>• SteamDB 기준 최고 동시 접속 240,817 명, 약 49 만 개 리뷰에서 압도적으로 긍정적 평가</li></ul> |



### 3. 콘텐츠 요약

탐색 준비, 경계 진입, 빛 관리, 위협 대응, 전승/탈출, 정산 콘텐츠가 서로 영향을 주며 반복되는 구조를 가진다.



## 4. SWOT / STP / MDA 분석

SWOT, STP, MDA 분석은 「Light」의 시장 적합성, 핵심 타겟, 플레이 경험 방향을 검토하기 위한 분석 항목이다.

이를 통해 프로젝트의 강점과 리스크를 정리하고, 빛 생존·공포·익스트랙션 구조가 유저에게 어떤 경험으로 전달되는지 확인한다.

### 4.1. SWOT




4.2. STP 도표





### 4.3. MDA 연결 구조

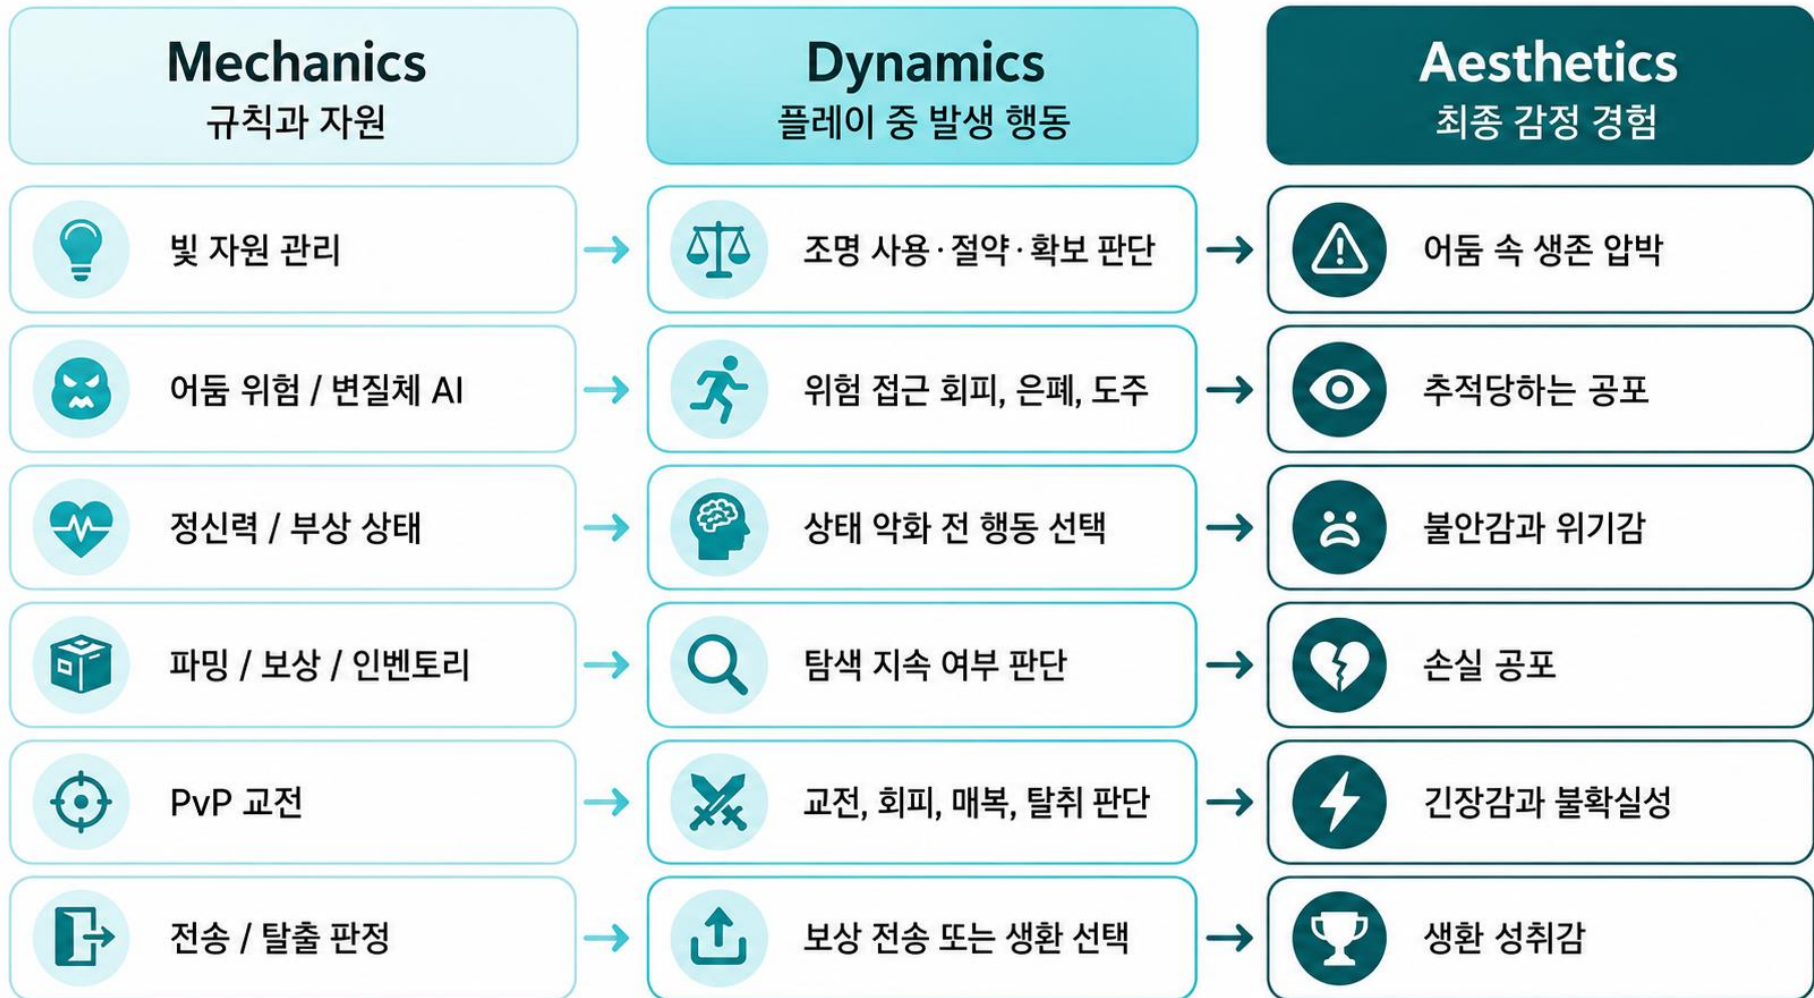



## 5. 기대 매출

### 기대 매출 산정 목적

기대 매출은 「Light」의 Steam Demo, 제한 Playtest, Early Access 후보 빌드 이후 상용화 가능성을 검토하기 위한 내부 추정값이다.  
본 산정은 PC / Steam 기반 유료 판매를 기준으로 하며, 실제 매출은 출시 시점, 할인을, 위시리스트 전환율, 환불률, 리뷰 점수, 업데이트 주기, 지역별 가격 정책에 따라 달라질 수 있다.

### 5.1. 기대 매출 시나리오

# LIGHT 기대 매출 시나리오

연간 총매출 / 계획 기여매출(62%)

| 시나리오 | 연간 총매출 (억원) | 계획 기여매출 (억원) |
|------|-------------|--------------|
| 보수   | 6.6         | 4.1          |
| 기준   | 25.0        | 15.5         |
| 상향   | 84.0        | 52.1         |

| 시나리오 | 연간 판매량    | 평균 판매가   | 연간 총매출  | 계획 기여매출 62% |
|------|-----------|----------|---------|-------------|
| 보수   | 30,000 장  | 22,000 원 | 6.6 억원  | 4.1 억원      |
| 기준   | 100,000 장 | 25,000 원 | 25.0 억원 | 15.5 억원     |
| 상향   | 300,000 장 | 28,000 원 | 84.0 억원 | 52.1 억원     |

| 시나리오 | 해석                                                      |
|------|---------------------------------------------------------|
| 보수   | Steam Demo 이후 제한적인 위시리스트 전환과 Early Access 초기 판매만 발생한 경우 |
| 기준   | 공포 생존, 익스트랙션 슈터, PvPvE FPS 유저층에서 일정 수준의 반응을 확보한 경우      |
| 상향   | 스트리머/커뮤니티 확산, 긍정적 Steam 리뷰, 지속 업데이트 기대감이 결합된 경우         |

## 6. MM 기반 조직 및 마일스톤

### 6.1. MM 산정 원칙

MM(Man-Month)은 한 명이 한 달 동안 투입되는 작업량이다. 「Light」는 24 개월 동안 총 480MM 을 투입하는 기준으로 산정한다. 이는 월평균 20 명 규모의 개발 조직을 전제로 하며, Steam Demo, 제한 Playtest, Early Access, 정식 출시 후보 빌드까지 검증하는 개발 범위다. 정식 출시 이후 시즌 운영과 대규모 콘텐츠 확장은 별도 단계로 산정한다.

#### 직군별 MM

| 직군             | MM    | 주요 책임                            |
|----------------|-------|----------------------------------|
| PD / PM        | 24    | 제품 비전, 일정, 예산, Gate, 외주/퍼블리싱 관리  |
| 시스템 / 콘텐츠 기획   | 36    | 세션, 빛/어둠, 정신력, 생명줄, 탈출, 루팅 규칙    |
| 레벨 / 밸런스 기획    | 36    | 맵 구조, 위험 구역, 보상 밀도, 밸런스, 테스트 기준  |
| 게임플레이 프로그래밍    | 72    | FPS 이동, 사격, 상호작용, 전투, 세션 처리      |
| AI / 시스템 프로그래밍 | 48    | 변질체 AI, 감지/추적/공격, 빛/어둠 연동        |
| UI / UX 프로그래밍  | 30    | HUD, 인벤토리, 컨테이너, 로비, 결과 화면       |
| 백엔드 / 온라인 / 툴  | 36    | 프로필 저장, 세션 데이터, 운영 도구, 분석 로그     |
| 테크니컬 아트 / VFX  | 30    | 조명, 어둠 표현, 광원 피드백, VFX, 최적화      |
| 환경 / 레벨 아트     | 54    | 경계 맵, 랜드마크, 블록아웃, 라이팅            |
| 캐릭터 / 몬스터 아트   | 36    | 점퍼, 변질체, 장비 실루엣, 리소스 제작          |
| 애니메이션          | 24    | 플레이어, 변질체 이동/공격/피격 애니메이션         |
| 사운드            | 12    | 공포 사운드, 변질체 전조음, UI/환경음          |
| QA / 빌드 / 릴리즈  | 42    | 기능 검증, 밸런스 테스트, Steam 빌드, 릴리즈 대응 |
| 합계             | 480MM | 24 개월 정식 출시 후보 기준                |

## 6.2. 24 개월 마일스톤

| 단계                  | 기간      | MM    | 목표                                 |
|---------------------|---------|-------|------------------------------------|
| P0 프리프로덕션           | M1~M2   | 30MM  | 범위 확정, 핵심 시스템 설계, 기술 리스크 잠금        |
| P1 코어 프로토타입         | M3~M5   | 60MM  | FPS 조작, 전투, 빛/어둠/정신력 기본 루프         |
| P2 버티컬 슬라이스         | M6~M9   | 90MM  | 1 개 핵심 맵, 세션/루팅/전력/탈출/생명줄 연결       |
| P3 Steam Demo       | M10~M13 | 90MM  | 데모 콘텐츠, 변질체, UI, 사운드, 연출, 최적화      |
| P4 제한 Playtest / 개선 | M14~M17 | 90MM  | 외부 테스트, 밸런스, 반복 플레이, 위험 구역 검증      |
| P5 Early Access 빌드  | M18~M21 | 80MM  | 콘텐츠 확장, 로비/상점/창고, 안정화, Steam 출시 준비 |
| P6 정식 출시 후보         | M22~M24 | 40MM  | QA, 성능, 릴리즈, 운영 준비, 최종 Gate        |
| 합계                  | 24 개월   | 480MM | Steam EA~정식 출시 후보                  |

## 6.3. Gate 의사결정 기준

| Gate | 판단 목표        | Go 기준                           | Hold / Fix 기준                      |
|------|--------------|---------------------------------|------------------------------------|
| G1   | 코어 조작/전투     | FPS 조작, 피격, 사격, 상호작용이 플레이 가능 수준 | 입력 지연, 피격 피드백, 기본 HUD 가독성 문제 개선    |
| G2   | 빛/어둠/정신력 루프  | 빛 부족, 어둠 체류, 정신력 압박이 명확히 체감     | 어둠이 단순 시야 제한으로만 느껴질 경우 재설계         |
| G3   | 버티컬 슬라이스     | 1 개 맵에서 탐색, 루팅, 전력, 탈출, 생명줄이 연결 | 보상/손실 판단이 약하면 루프와 보상 밀도 수정         |
| G4   | Steam Demo   | 20~30 분 내 핵심 재미와 차별점 전달         | 튜토리얼, UI, 사운드, 성능 문제로 이탈이 높을 경우 개선 |
| G5   | Early Access | 반복 플레이 의향과 업데이트 기대감 확보          | 콘텐츠 양보다 핵심 루프 신뢰도가 부족하면 보류         |
| G6   | 정식 출시 후보     | 안정성, QA, 릴리즈, 운영 준비 기준 통과       | 치명적 버그, 성능 저하, 세션/저장 오류 우선 수정      |

# 24개월 MM 기반 개발 마일스톤 (총 480MM)

Steam Demo · 제한 Playtest · Early Access · 정식 출시 후보 빌드 검증

| 단계                                            | M1            | M2 | M3                 | M4 | M5 | M6                 | M7 | M8 | M9 | M10                  | M11 | M12 | M13                        | M14 | M15 | M16 | M17                       | M18 | M19 | M20 | M21 | M22                | M23 | M24 |
|-----------------------------------------------|---------------|----|--------------------|----|----|--------------------|----|----|----|----------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----|---------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------|-----|-----|
| <b>P0</b><br>프리프로덕션<br>범위 확정 · 리스크 잠금         | 프리프로덕션   30MM |    |                    |    |    |                    |    |    |    |                      |     |     |                            |     |     |     |                           |     |     |     |     |                    |     |     |
| <b>P1</b><br>코어 프로토타입<br>FPS 조각 · 기본 루프       |               |    | P1 코어 프로토타입   60MM |    |    |                    |    |    |    |                      |     |     |                            |     |     |     |                           |     |     |     |     |                    |     |     |
| <b>P2</b><br>버티컬 슬라이스<br>1개 핵심 맵 · 시스템 연동     |               |    |                    |    |    | P2 버티컬 슬라이스   90MM |    |    |    |                      |     |     |                            |     |     |     |                           |     |     |     |     |                    |     |     |
| <b>P3</b><br>Steam Demo<br>데모 콘텐츠 · 최적화       |               |    |                    |    |    |                    |    |    |    | P3 Steam Demo   90MM |     |     |                            |     |     |     |                           |     |     |     |     |                    |     |     |
| <b>P4</b><br>제한 Playtest / 개선<br>외부 테스트 · 밸런스 |               |    |                    |    |    |                    |    |    |    |                      |     |     | P4 제한 Playtest / 개선   90MM |     |     |     |                           |     |     |     |     |                    |     |     |
| <b>P5</b><br>Early Access 빌드<br>콘텐츠 확장 · 안정화  |               |    |                    |    |    |                    |    |    |    |                      |     |     |                            |     |     |     | P5 Early Access 빌드   80MM |     |     |     |     |                    |     |     |
| <b>P6</b><br>정식 출시 후보<br>QA · 릴리즈 · 운영 준비     |               |    |                    |    |    |                    |    |    |    |                      |     |     |                            |     |     |     |                           |     |     |     |     | P6 정식 출시 후보   40MM |     |     |

|                          |                   |                      |                   |
|--------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 개발 기간<br>24개월 (M1 ~ M24) | 총 투입 규모<br>480 MM | 최종 목표<br>정식 출시 후보 빌드 | 다음 단계<br>출시·운영 준비 |
|--------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|

※ 본 마일스톤은 24개월 / 480MM 기준이며, 정식 출시 이후 시즌 운영과 대규모 콘텐츠 확장은 별도 산정한다.



## 7. 소요비용 견적

### 견적 산정 기준

본 견적은 24 개월 / 480MM 개발 범위에 평균 연봉 4,000 만 원을 적용해 산정한다. 평균 연봉 4,000 만 원은 1 인 12 개월 투입 기준이며, 직접 인건비는 각 직군 MM 을 연간 인건비 기준으로 환산해 계산한다. 직접경비는 PC / Steam 출시 준비, 장비, 소프트웨어, 외주, QA, 사운드, 스토어 에셋을 포함한 계획값으로 둔다.

| 항목      | 산정 기준                             | 값               |
|---------|-----------------------------------|-----------------|
| 개발 기간   | 정식 출시 후보 빌드 기준                    | 24 개월           |
| 총 MM    | 월평균 20 명 × 24 개월                  | 480MM           |
| 평균 연봉   | 1 인 12 개월 기준                      | 40,000,000 원    |
| 월 환산 단가 | 40,000,000 원 ÷ 12 개월              | 3,333,333 원     |
| 직접 인건비  | 480MM ÷ 12 개월 × 40,000,000 원      | 1,600,000,000 원 |
| 직접경비    | 장비, 소프트웨어, 외주, QA, 사운드, Steam 준비비 | 400,000,000 원   |

### 24 개월 공식 견적

| 항목        | 산식 / 기준                           | 금액                           |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------|
| 직접 인건비    | 480MM × 평균 연봉 4,000 만 원 기준        | 1,600,000,000 원              |
| 제경비 110%  | 직접 인건비 × 110%                     | 1,760,000,000 원              |
| 직접경비      | 장비, 소프트웨어, 외주, QA, 사운드, Steam 준비비 | 400,000,000 원                |
| 공급가액      | 직접 인건비 + 제경비 + 직접경비               | 3,760,000,000 원              |
| VAT 10%   | 공급가액 × 10%                        | 376,000,000 원                |
| 예비비 10%   | (공급가액 + VAT) × 10%                | 413,600,000 원                |
| 공식 총견적 합계 | 공급가액 + VAT + 예비비                  | 4,549,600,000 원 / 약 45.5 억 원 |

직접경비 세부

| 항목                    | 금액            | 포함 내용                        |
|-----------------------|---------------|------------------------------|
| 개발 장비 / 테스트 PC        | 80,000,000 원  | 워크스테이션, 테스트 PC, 모니터, 빌드 장비   |
| 소프트웨어 / 협업 / 소스관리     | 50,000,000 원  | DCC, 플러그인, 프로젝트 관리, 클라우드, 백업 |
| 서버 / 분석 / 빌드 / 클라우드   | 50,000,000 원  | 개발·스테이징 인프라, 로그, 모니터링        |
| 사운드 / 음악 외주           | 40,000,000 원  | 공포 사운드, 변질체 전조음, BGM, 믹싱     |
| 외부 QA / 플레이테스트        | 60,000,000 원  | 외부 테스트, 설문, 회귀 테스트, 호환성 검증   |
| 키아트 / 트레일러 / 스토어 에셋   | 70,000,000 원  | Steam 페이지 이미지, 트레일러, 홍보용 키아트 |
| 법무 / 등급 / Steam 출시 준비 | 30,000,000 원  | 등급, 약관, 상표, 스토어 등록 준비        |
| 기타 / 예비 직접비           | 20,000,000 원  | 소모품, 인증 계정, 예비 직접비           |
| 합계                    | 400,000,000 원 | 직접경비 계획값                     |

공식 견적 산식

| 단계 | 산식                         | 비고             |
|----|----------------------------|----------------|
| 1  | 직접 인건비 = 총 MM ÷ 12 × 평균 연봉 | 480MM 기준       |
| 2  | 제경비 = 직접 인건비 × 110%        | 공식 견적 기준       |
| 3  | 공급가액 = 직접 인건비 + 제경비 + 직접경비 | VAT 이전 금액      |
| 4  | VAT = 공급가액 × 10%           | 부가세            |
| 5  | 예비비 = (공급가액 + VAT) × 10%   | 범위·일정·외주 변동 대응 |
| 6  | 총견적 = 공급가액 + VAT + 예비비     | 최종 공식 견적       |

## 8. 참고 자료 / 출처

본 장은 「Light」 개발제안서의 시장 분석, 벤치마크, 기대 매출 산정에 사용한 외부 자료를 정리한다.

### 8.1. 시장 규모 및 플랫폼 자료

Newzoo 는 2025 년 글로벌 게임 시장 매출을 2,016 억 달러, 전년 대비 9.1% 성장으로 집계했으며, PC 게임 시장은 436 억 달러, 전년 대비 12.0% 성장으로 정리했다. [Newzoo](#)

Newzoo 는 2025 년 PC 시장에서 Top 20 밖 게임의 매출 비중이 56%까지 증가했다고 정리했다. [Newzoo](#)

Newzoo 는 2025 년 PC·콘솔 시장에서 슈터 장르와 신규 IP의 성과를 주요 흐름으로 정리했다. [Newzoo](#)

### 8.2. 벤치마크 자료

GamesRadar 는 Newzoo 의 2026 PC & Console Gaming Report 를 인용해 Escape from Tarkov 가 2025 년 PC 전체 플레이타임 기준 11 위에 올랐다고 보도했다. [GamesRadar](#)

Nexon 은 ARC Raiders 가 출시 10 주 후 1,240 만 장 판매와 96 만 명 동시 접속을 기록했다고 발표했다. [BusinessWire](#)

Nexon 의 2025 년 3 분기 실적 자료는 ARC Raiders 가 출시 초기 400 만 장 판매와 70 만 명 이상 동시 접속을 기록했다고 설명한다. [Nexon\\_PDF](#)

GameDeveloper 는 Push to Talk 추정을 인용해 Lethal Company 가 약 1,000 만 장 판매를 기록한 것으로 추정된다고 보도했다. [GameDeveloper](#)

SteamDB 는 Lethal Company 의 최고 동시 접속자 수를 240,817 명, 리뷰 약 49 만 개와 압도적으로 긍정적 평가로 집계하고 있다. [SteamDB](#)

GameSpot 은 2025 년 10 월 Steam Next Fest 에서 가장 많이 플레이된 데모 목록에 호러, 어드벤처, 협동 장르 게임이 다수 포함되었다고 정리했다. [GameSpot](#)
